




**MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES**

# Presupuesto Participativo 2014

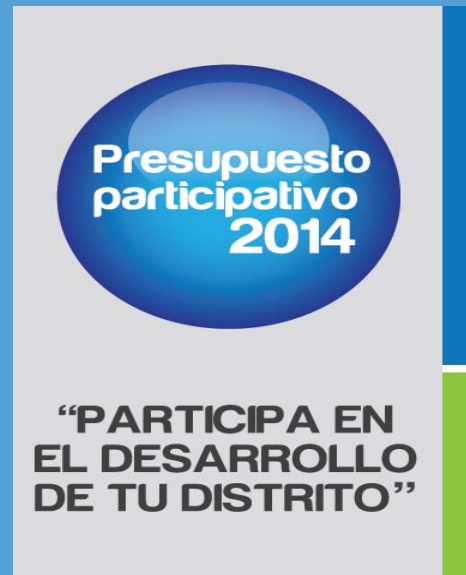

**26 de Setiembre del 2013**



**MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES**

# Rendición de Cuentas

**Proyectos  
Priorizados  
Presupuesto  
Participativo  
2012**

**Jorge Muñoz Wells  
Alcalde**



**MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES**

# Proyectos priorizados en el proceso del PP 2012

**Acta de Acuerdos y  
Compromisos de fecha  
11.08.2011**



**08 Proyectos  
Priorizados por la  
suma de  
S/. 12'350,180.00  
(\* )**

**(\* ) Monto asignado para PP Año Fiscal 2012  
S/. 10,000,000.00, conforme Art. 7 Ordenanza  
N° 353-MM.**

# Lista de Proyectos priorizados PP 2012



Prioridad	Nombre del Proyecto	Monto de Inversión Referencial S/.	Votos obtenidos
1	REFORZAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS BOMBEROS DE MIRAFLORES CON LA COMPRA DE UNA UNIDAD ESCALERA TELESCOPICA	4'500,000.00	41
2	REMOZAMIENTO DE LA CALLE ALFONSO UGARTE (3 CUADRAS)	600,000.00	13
3	MEJORAMIENTO DE LA FLOTA, RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR Y MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	1'050,000.00	11
4	ENMALLADO DEL ACANTILADO PARA SU TOTAL VERDEAMIENTO Y SEGURIDAD ANTE DERRUMBES	910,000.00	9
5	CENTRAL DE COMANDO/ EMERGENCIA UBICADO EN EL TERCER PISO DE LA BASE DE SERENAZGO, AV. AREQUIPA.	1'500,000.00	8
6	RECUPERACION DE BERMAS LATERALES EN AV. GRAU.	65,000.00	3
7	INSTALACION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO PARA LA ACTIVACION DE LA RED DE ASPERSORES EN LA VIA CENTRAL DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES.	155,817.00	2
8	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CA. BELLAVISTA, CA. RECAVARREN, CA. REVETT, Y CA. FAJARDO, DISTRITO DE MIRAFLORES	3'569,363.00	2 (*)
	<b>TOTAL</b>	<b>12'350,180.00</b>	<b>(*)</b>

(\*) Siendo el monto asignado para el Presupuesto Participativo para el Año Fiscal 2012 la suma de S/. 10'000,000.00 de Nuevos Soles, conforme el Artículo 7 de la Ordenanza N° 353-MM, este proyecto se ejecutaría en una primera etapa hasta el importe que alcance el monto asignado, el cual podría ser incrementado de acuerdo a los mayores recursos en el Año Fiscal 2012.



# Mejoramiento del Servicio Contra Incendio y Rescate de Altura de la Cía. De Bomberos Miraflores 28 - SNIP 196934



**Monto Ejecutado**  
**S/. 4,803,270.98**

- ✓ **01 Unidad - bomba con escalera telescópica adquirida.**
- ✓ **Equipamiento contra incendio y rescate de altura adquirido.**

**PROYECTO  
CONCLUÍDO**





# Mejoramiento de los componentes urbanísticos de la calle Alfonso Ugarte – SNIP 186504



**ANTES**

**PROYECTO CONCLUÍDO**



**DESPUES**

**Monto Ejecutado**  
**S/. 454,505.35**

<b>Veredas mejoradas</b>	<b>944.85 m2</b>
<b>Martillos mejorados</b>	<b>434.44 m2</b>
<b>Iluminación mejorada</b>	<b>16 unidades</b>
<b>Jardineras mejoradas</b>	<b>30 unidades</b>
<b>Pases peatonales construidos</b>	<b>964.21 m2</b>



# Mejoramiento de la capacidad operativa de patrullaje del servicio de Seguridad Ciudadana – SNIP 207456

Monto Ejecutado  
S/. 1,187,250.00

- ✓ **12 automóviles adquiridos.**
- ✓ **61 motocicletas adquiridas.**
- ✓ **20 Bicicletas adquiridas.**





# Mejoramiento de los Acantilados de las Zonas de los Delfines, Punta Roquitas, Waikiki y Bajada Balta – SNIP 217990



**Contrato de obra:** N° 120-2012 mediante ADP N°006-2012-CE/MM

**Monto Contratado:** S/. 1,517,718.29

**Inicio de obra:**

La Obra aún no ha sido iniciada debido a que a la fecha no se recibe respuesta afirmativa sobre la reconsideración del horario de trabajo del Nocturno al Diurno de la Gerencia de Transporte Urbano (GTU) de la Municipalidad Metropolitana de Lima para la autorización del cierre de vía.

**Descripción:** La obra consiste en la colocación de mallas para estabilizar taludes, en el Acantilado de la Costa Verde.





# Ampliación del local de Seguridad Ciudadana de la Av. Arequipa – SNIP 201223



- ✓ Se llevó a cabo la Licitación N° 011-2012-CE/MM para la realización del proyecto, mediante modalidad de Concurso Oferta ( elaboración de expediente técnico y ejecución de obra ) por el monto de S/.1,693,998.00
- ✓ Se firmó Contrato el 03/09/2012 .
- ✓ Por incumplimiento se rescindió el Contrato.
- ✓ La Gerencia de Obras y Servicios Públicos se encuentra elaborando el Expediente Técnico.



# Rehabilitación y Mejoramiento de las bermas laterales de la Av. Grau, Sector 4B



**ANTES**

**Monto Ejecutado**  
**S/. 94,616.22**

Elaboración de Expediente técnico	
Bermas terminadas con Grass block	99.40 m2
Bermas rehabilitada con Grass natural	250.00 m2
Jardineras circulares terminadas	23 unidades



**DESPUES**


**PROYECTO CONCLUÍDO**



# Instalación de un sistema de distribución de recurso hídrico para activación de red de aspersores en la Av. Central de la Av. Arequipa - SNIP 152699



**PROYECTO CONCLUÍDO**

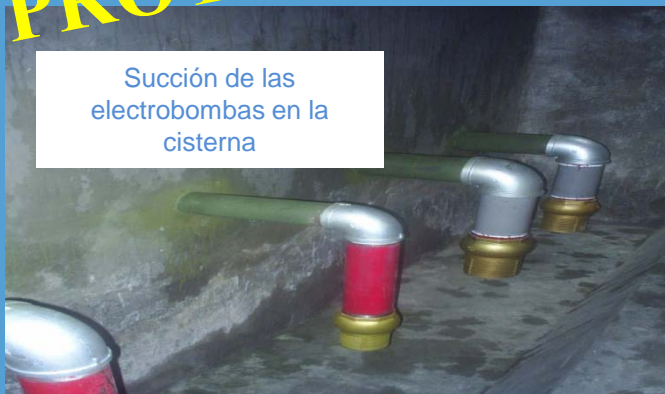

**Monto Ejecutado**  
**S/. 208,660.80**

Construcción y equipamiento de una cisterna de 70 m<sup>3</sup>, en el parque Fermín Tangüis, desde la cual y, de dos grupos de electrobombas, se impulsa el agua hacia la red matriz de aspersores instalados en la berma central de la Av. Arequipa (cuadras 38-52), siendo el área a regar de 13,172.15 m<sup>2</sup>.



Área verde recuperada en el área de la cisterna al finalizar la obra.



# Mejoramiento de la Infraestructura vial de las calles pertenecientes al sector 8C (Recavarren, Fajardo, Revett, Francisco de Paula y Camino y Bellavista – SNIP 201099

**ANTES**



**PROYECTO CONCLUÍDO**

**DESPUES**



**Monto Ejecutado**  
S/. 3,417,382.30

**Mejoramiento de :**

Calzada con asfalto	8,900 m2
Calzada con adoquín	3,121 m2
Bermas laterales con adoquines	3,914 m2
Veredas	6,975 m2
Rampas	1 gbl
Jardineras	305 unidades
Mobiliario Urbano y Señalización.	



## SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO - 2012

Prioridad	PIP Cod. SNP	Denominación Técnica del Estudio	Area Responsable	Monto Ejecutado	Situación
1	196934	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CONTRA INCENDIO Y RESCATE DE ALTURA DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS MIRAFLORES N° 28, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	4,803,270.98	Concluido
2	186504	MEJORAMIENTO DE LOS COMPONENTES URBANISTICOS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	454,505.35	Concluido
3	207456	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE PATRULLAJE DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA-LIMA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	1,187,250.00	Concluido
4	217990	MEJORAMIENTO DE LOS ACANTILADOS DE LAS ZONAS DE LOS DELFINES, PUNTA ROQUITAS, WAIKIKI Y BAJADA BALTA, DISTRITO DE MIRAFLORES - LIMA -LIMA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0	En ejecución
5	201223	AMPLIACION DEL LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES, LIMA-LIMA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0	En ejecución
6	201037	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS BERMAS LATERALES DE LA AV. GRAU. SECTOR 4B, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,616.22	Concluido
7	152699	INSTALACION DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION DE RECURSO HIDRICO PARA LA ACTIVACION DE LA RED DE ASPERSORES EN LA VIA CENTRAL DE LA AV. AREQUIPA, DISTRITO DE MIRAFLORES	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	208,660.80	Concluido
8	201099	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES AL SECTOR 8C, DISTRITO DE MIRAFLORES-LIMA-LIMA	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,417,382.30	Concluido
<b>TOTAL</b>				<b>10,165,685.65</b>	



**MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES**

# RESUMEN

## SITUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PRIORIZADOS EN PP 2012:

**06 PROYECTOS CONCLUÍDOS S/.10,165,685.65**

**02 PROYECTOS EN EJECUCIÓN S/. 3,500,000.00 aprox.**



**MUNICIPALIDAD DE  
MIRAFLORES**

gracias

Web Municipal: [www.miraflores.gob.pe](http://www.miraflores.gob.pe)
