PROYECTO "PARQUE BICENTENARIO"

EXPEDIENTE TÉCNICO

DIAGRAMA DE GANTT

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**PROYECTO PARQUE BICENTENARIO**	**300 días**
2		INICIO	0 días
3		**OBRAS URBANAS**	**300 días**
4		OBRAS PRELIMINARES	300 días
5		DEMOLICIONES	30 días
6		MOVIMIENTO DE TIERRAS	120 días
7		RECORRIDOS Y PLAZOLETAS	210 días
8		MOBILIARIO URBANO	60 días
9		COSTOS AMBIENTALES	300 días
10		SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES	90 días
11		SISTEMA DE RIEGO	60 días
12		SIST.ESTABILIZACION MECANICA DE TALUDES	150 días
13		**EDIFICACIONES**	**270 días**
14		CONCRETO	150 días
15		PISOS	120 días
16		REVOQUES Y ENLUCIDOS	150 días
17		PINTURA	60 días
18		CARPINTERIA	90 días
19		APARATOS SANITARIOS	60 días
20		ACCESORIOS SANITARIOS	30 días
21		APARATOS ELECTRICOS	30 días
22		CISTERNA Nº 02	60 días
23		**INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS**	**150 días**
24		INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES	150 días
25		INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES	150 días
26		INSTALACIONES MECANICAS	150 días
27		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**150 días**
28		SISTEMA DE AGUA FRIA	90 días
29		SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	150 días
30		INSTALACIONES ESPECIALES	150 días
31		**PAISAJISMO**	**150 días**
32		SISTEMA ZINCO-TECHOS VERDES	150 días
33		SUMINISTRO DE SUSTRATOS	150 días
34		OBRAS DE PAISAJISMO	60 días
35		FIN	0 días

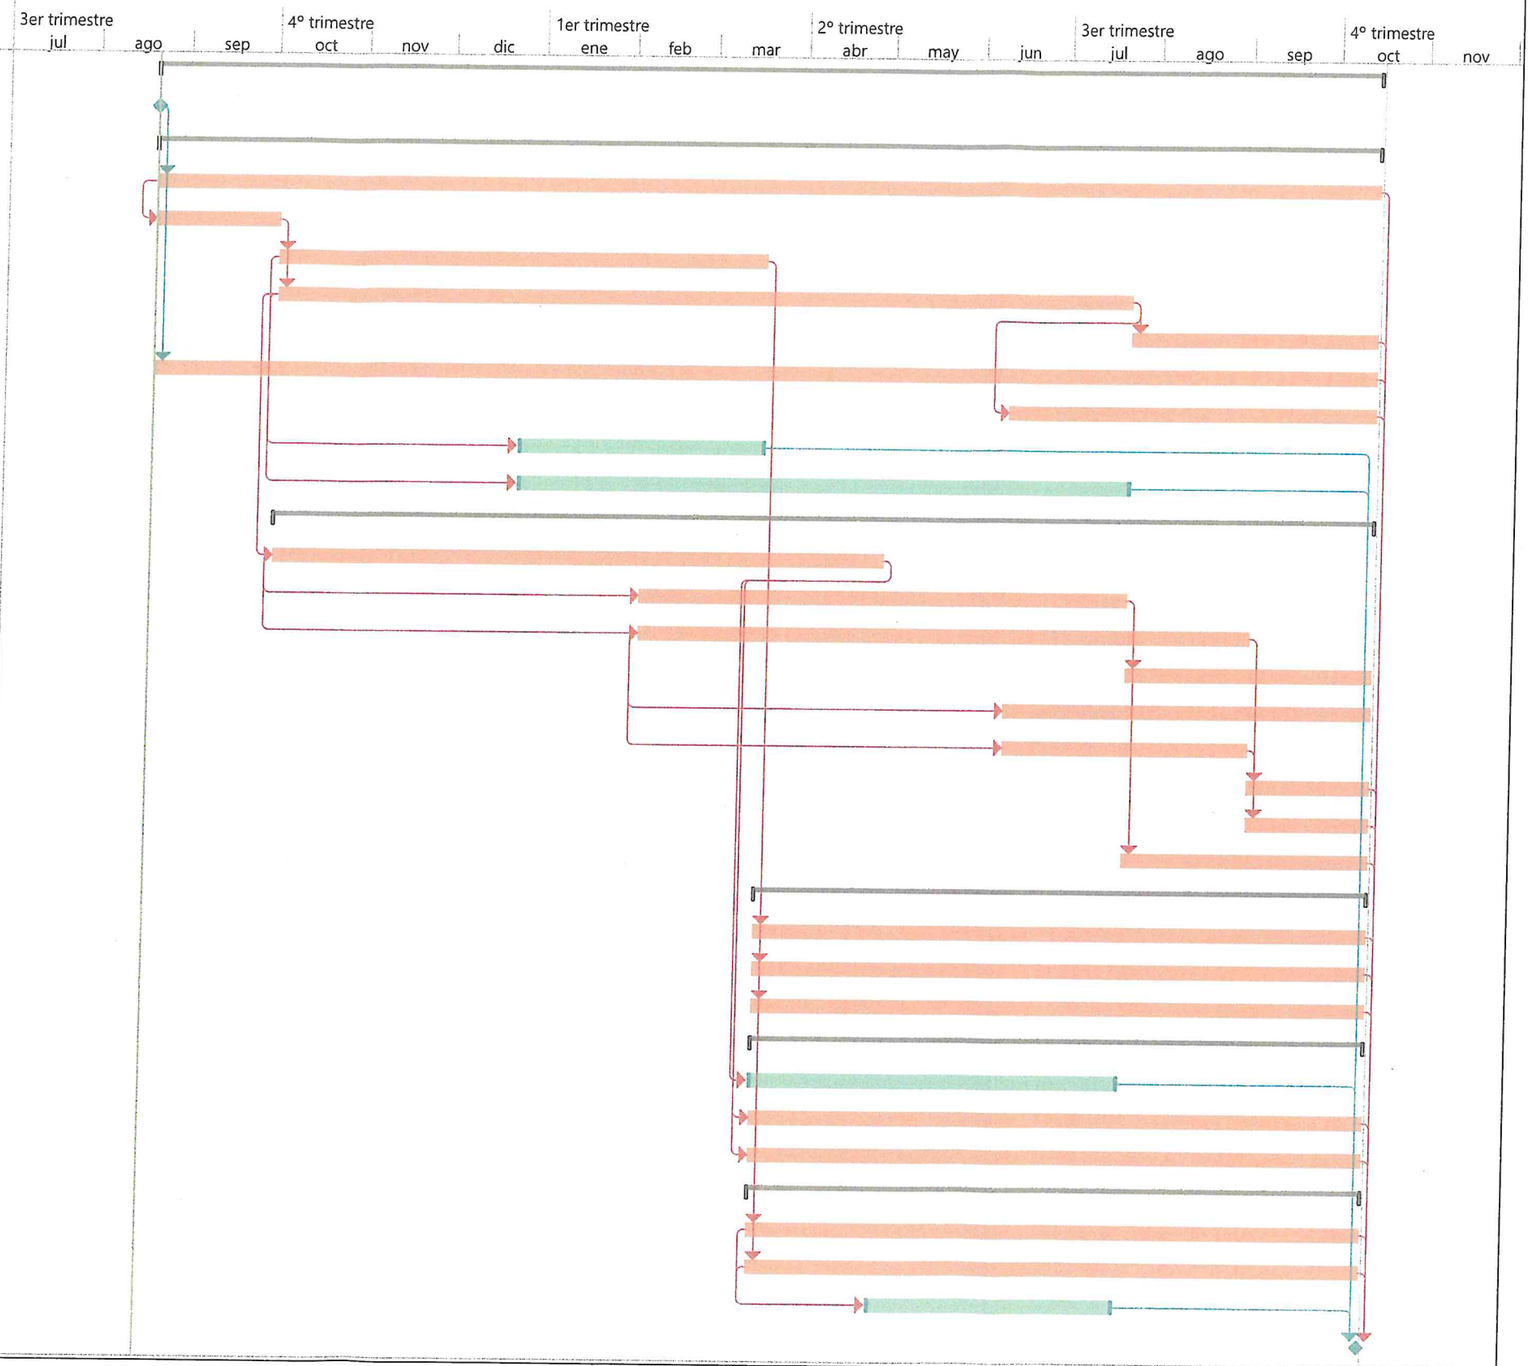

Proyecto: PROJECT PQUE BIC
Fecha:

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso

Progreso manual

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
JOSÉ ALBERTO ONO CANTORAL
Subgerente
Subgerencia de Obras Públicas
